




www.rvr.ruhr



WALDband

4. Statusbericht
Juli 2021

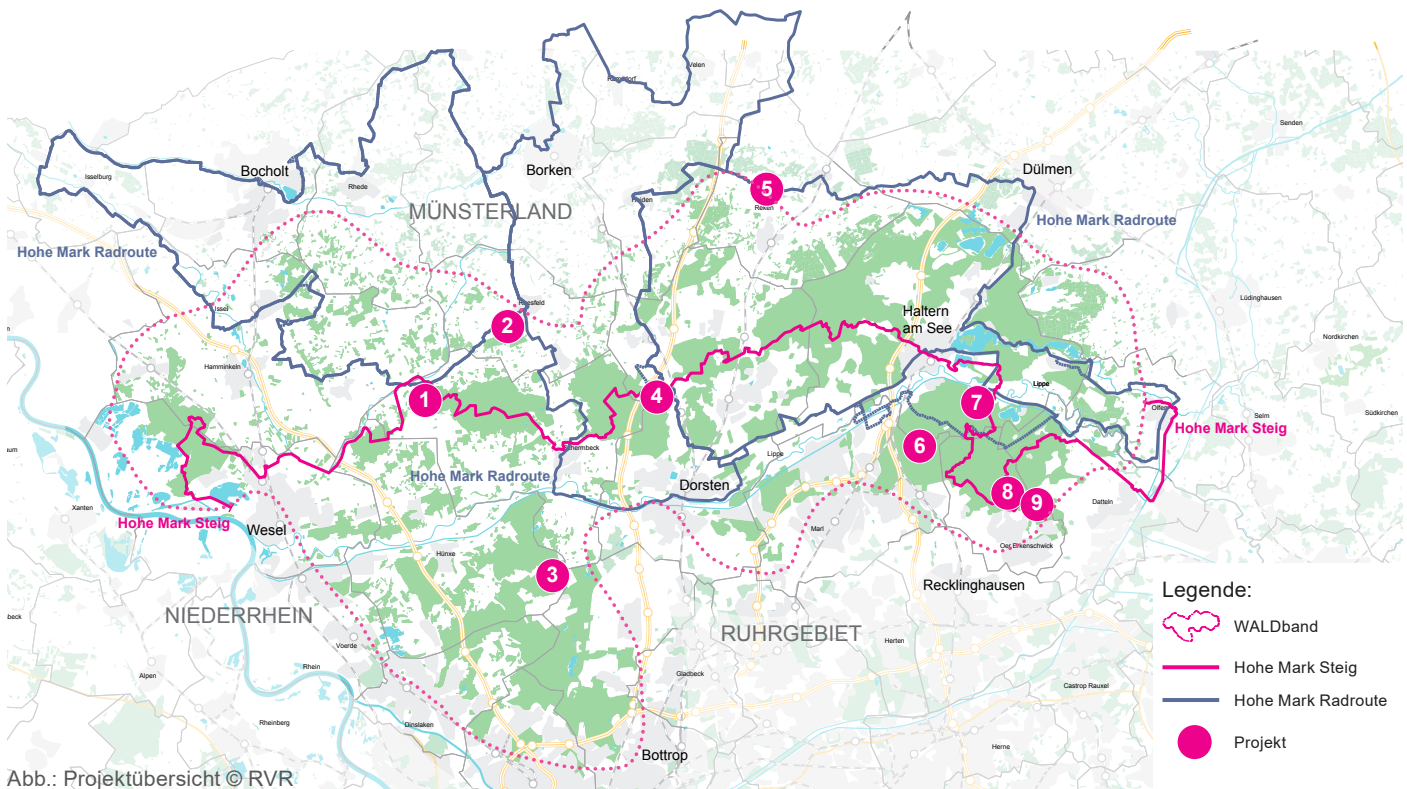

Das Projekt WALDband ist aus der Regionale 2016 ZukunftsLAND hervorgegangen und ein Impulsprojekt für den Naturpark Hohe Mark. Es befindet sich weiterhin in der Realisierungsphase. Von 16 Teilprojekten konnten bisher 9 Teilprojekte mit einer Gesamtsumme von 4 Mio. € fertig gestellt werden, darunter der Hohe Mark Steig, der im April 2021 eröffnet wurde.

Der Projekt-Raum im Übergang von Metropole Ruhr, Münsterland und Niederrhein verfügt über große zusammenhängende Waldflächen und stellt damit einen besonderen Wert und ein besonderes Potenzial dar. Auf den Waldflächen und ihren Zwischenräumen lastet ein hoher Nutzungsdruck zahlreicher konkurrierender Interessen. Um modellhafte Antworten auf die Zukunftsfragen dieses Raumes zu finden, arbeiten als gemeinsame Projektträger der Regionalverband Ruhr, der Landesbetrieb Wald und Holz NRW und der Naturpark Hohe Mark Westmünsterland e.V. zusammen. Das Projektgebiet umfasst große Teile des Naturpark Hohe Mark mit den RVR-Mitgliedskommunen Bottrop, Datteln, Dinslaken, Dorsten, Haltern am See, Hamminkeln, Hünxe, Marl, Oer-Erkenschwick, Schermbeck und Wesel.

Die Ziele des Projektes WALDband entsprechen den Zielsetzungen der RVR-Strategie in den Strategiefeldern Tourismus und Freizeit sowie Ökologie.

Sachstand Teilprojekte

Von den insgesamt 16 Teilprojekten wurden bzw. werden 13 Teilprojekte mit EU- und/oder Landesmitteln gefördert. Mit den 13 Teilprojekten konnten damit Fördermittel in einer Höhe von rund 4,5 Mio. € akquiriert werden.

Aktuell bis Mitte 2021 fertig gestellt:

- **Hohe Mark Steig - Infrastruktur** - Ausschilderung und Ausstattung eines 140 km langen, Qualitäts-Fernwanderweges von Wesel bis Olfen mit sechs Etappen zwischen 19 und 28 km sowie einer Wasserroute von 18 km; Realisierung der Ausschilderung, Wegemarkierung, Rastplätze, Schutzhütten und Bänke
- **Naturverträgliche Tourismusentwicklung der Haard** mit den Bausteinen
 - **WALDband** - Erlebnisweg mit zwei Einstiegsorten sowie einem Aussichtspunkt, sechs Erlebnisstationen, 20 Bankstandorten z.T. mit Info - Elementen
 - **Mountainbike-Route** - 42 km langer attraktiver Rundkurs mit sechs Zubringerstrecken
 - **Themen-Wanderwegen** - 16 Themenwanderwege unterschiedlicher Länge ausgehend von 7 Wanderparkplätzen einschließlich einer Kinderroute
 - **Orientierungssystem** - Beschilderung zur Haard, Parkleitsystem, Infotafeln, Ausschilderung in der Haard

WALDband Teilprojekte

Teilprojekt mit A-Status der Regionale 2016 (Projektossier 2015)	Thema	Träger	Aktueller Stand 07.2021 (Änderungen gegenüber 2020)	Kostenschätzung Dossier / EFRE - Projektbeschreibung 2015	Förderung / Finanzierung	(Förderfähige) Projektsumme	Differenz in €	Nummerierung im Übersichtsplan
Walderlebnisweg Reken	Umweltbildung	Gemeinde Reken	Fertig gestellt 2016	30.000	LEADER	30.000	0	5
Waldgesichter	Raumanalyse/Raumidentität Ausstellung	RVR	Fertig gestellt 2017	80.000	Eigenmittel RVR	10.000	-70.000	Gesamt- raum
Inklusion in der Landschaft	Inklusion	Akademie des Handwerks Raesfeld	Fertig gestellt 2017	470.000	NRW.vital	240.000	-230.000	2
Biene trifft Wildschwein	Biodiversität	RVR	Fertig gestellt 2017	70.000	Eigenmittel RVR RuhrGrün	39.000	-31.000	7
Regionaltouristisches Konzept	Regional-tourismus	RVR	Fertig gestellt 2018	231.000	EFRE	173.000	-58.000	Gesamt- raum
Neue Wildnis Dämmerwald	Umweltbildung	Gemeinde Schermbeck mit W+H	Fertig gestellt 2018	127.000	LEADER	380.000	+253.000	1
Hohe Mark Steig - Infrastruktur	Regional-tourismus	RVR	Fertig gestellt 2021	832.000	EFRE	1.263.000	+431.000	Gesamt- raum
Die Haard - Naturverträgliche Tourismusedwicklung	Regional-tourismus	RVR	Fertig gestellt 2021	1.756.000	EFRE	1.471.000	-285.000	6
Stimberghöhe (nicht Bestandteil Dossier 2015)	Biodiversität/ Umweltbildung	Kreis Recklinghausen	Fertigstellung Ende 2021	nicht Bestandteil Dossier 2015	FöNa	430.000	+430.000	8
Internetauftritt NPHM („Vom Verbot zum Angebot“)	Regional-tourismus	NPHM	Fertigstellung Ende 2021	102.000	EFRE	103.000	+1.000	Gesamt- raum
Spielplatz Waldpromenade in der Haard	Regional-tourismus	Stadt Oer-Erkenschwick	Fertigstellung Ende 2021	108.000 (Verbundprojekt Waldpromenade)	EFRE	218.000	+110.000	9
Hohe Mark Steig - Marketing	Regional-tourismus	NPHM	Fertigstellung 2022	346.000	EFRE	380.000	+34.000	Gesamt- raum
Hohe Mark Radroute	Regional-tourismus	NPHM	Fertigstellung 2022	136.000	EFRE	544.000	+408.000	Gesamt- raum
Willkommen im WALDband	Regional-tourismus	NPHM	Fertigstellung 2022	230.000	EFRE	200.000	-30.000	Gesamt- raum
Waldweideprojekt in der Üfter Mark (nicht Bestandteil Dossier 2015)	Biodiversität	RVR	Fertigstellung 2022	nicht Bestandteil Dossier 2015	Eigenmittel RVR Ruhr Grün	Aktuelle Schätzung 100.000	+100.000	4
Ehemaliges Munitionsdepot Hünxe (nicht Bestandteil Dossier 2015)	Biodiversität	RVR	In Planung (Fördersumme Planung 37.000)	nicht Bestandteil Dossier 2015	FöNa	Aktuelle Schätzung 187.000	+187.000	3
ELA-Sturm-Erlebnis Wald	Umweltbildung	Stadt Recklinghausen	Vom Träger zurück gestellt	114.000	./.	0	-114.000	./.
Dingdener Heide	Regional-Tourismus	Stiftung Dingdener Heide	Integration in Hohe Mark Radroute	487.000	./.	0	-487.000	./.
Jugend-Erlaubnis Wald	Umweltbildung	LWL Haard-Klinik	Wird vom Träger nicht weiterverfolgt	84.000	./.	0	-84.000	./.
Summe				5.203.000		5.768.000	+565.000	

In der Umsetzung bis Ende 2021:

- **Stimberghöhe** - Naturschutz-Entwicklung auf dem Stimberg in der Haard mit umweltpädagogischen Elementen
- **Vom Verbot zum Angebot** - ein neuer Internet-Auftritt für den Naturpark Hohe Mark
- **Spielplatz an der Waldpromenade Haard** - ein neues Spielangebot für Familien mit Kindern am Südrand der Haard

In der Umsetzung bis 2022:

- **Willkommen im WALDband** - Konzeptionierung und Ausstattung von Willkommensorten im Naturpark
- **Hohe Mark Steig - Marketing** - touristische Vermarktung des Fernwanderweges von Wesel bis Olfen
- **Hohe Mark Radroute** - Weiterentwicklung und Qualifizierung des rund 300 km langen Rundkurses durch den Naturpark
- **WALDweideprojekt in der Üfter Mark** - Sicherung der Biodiversität durch ökonomisch und ökologisch nachhaltige Neophytenbekämpfung

In der Planung:

- **Ehemaliges Munitionsdepot Hünxe** - Biodiversität durch Niederwaldbewirtschaftung und biotopverbessernde Maßnahmen sowie ein barrierefreier Naturerlebnisrundweg

Fertigstellungen und Eröffnungen in 2020/2021

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Eröffnungen zeitlich verschoben sowie in verändertem, kleinen Rahmen durchgeführt. Den Anfang machte die Eröffnung der Mountainbike-Route „Haard on Tour“ im Juni 2020 gefolgt von der Fertigstellung der Themenwanderwege durch die Haard im August. Im Oktober 2020 konnte die „WALDpromenade“ – ein Erlebnisweg am Südrand der Haard mit Naturerlebnis-Stationen und einem barrierearmen Rundweg – von Regierungspräsidentin Feller und Regionaldirektorin Geiß-Netthöfel freigegeben werden. Als jüngster Baustein der Naturverträglichen Tourismusentwicklung der Haard wurde im Juni 2021 der Ausbau des Beschilderungs- und Orientierungssystems abgeschlossen.

Auch die offizielle Eröffnung des Hohe Mark Steigs am 16. April 2021 durch Frau Feller, Frau Geiß-Netthöfel und die Geschäftsführerin des Naturparks Frau Beckmann musste Corona bedingt in kleinem Rahmen gehalten werden. Die Resonanz

in der Presse und durch Wandernde ist groß und sehr positiv (siehe www.hohe-mark-steig.de). Der Naturpark plant im Jahresverlauf noch mehrere dezentrale Veranstaltungen auf dem Steig. Die Zertifizierung als „Qualitätsweg wanderbares Deutschland“ wird für Herbst 2021 angestrebt.



© RVR/Wiciok

Bis Ende 2021 fertig gestellt wird auch das Teilprojekt Stimberghöhe mit den Schwerpunktthemen Biodiversität und Umweltbildung. Info- und Hörstationen sowie eine eigene Homepage ergänzen das dort bereits errichtete Grüne Klassenzimmer. (www.natuerlich-stimberg.de)

Ausblick

Mit der geplanten Fertigstellung von vier weiteren Teilprojekten in 2022 und dem Auslaufen der Förderstelle Projektmanagement im März 2022 endet die Phase des im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierten Projektes WALDband und seiner Teilprojekte.

Unter dem Titel WALDband 2.0 wird der erfolgreiche Weg, insbesondere mit dem Leitprodukt Hohe Mark Erlebnisräume fortgesetzt. Mit dem Projekt WALDband gelingt es somit fortlaufend, dem Naturpark wichtige Entwicklungsimpulse zu geben und ihn als regionaltouristische Marke sowie bedeutenden Standortfaktor für die Metropole Ruhr nachhaltig zu stärken.

Ansprechpartner

Regionalverband Ruhr

Referat Regionalentwicklung

Martin Wirtz

Kronprinzenstraße 35

45128 Essen

0201 2069-650

wirtz@rvr.ruhr

www.rvr.ruhr/themen/tourismus-freizeit/waldband

www.naturpark-hohe-mark.de/de/was-ist-das-waldband/
